



UNION EUROPEENNE



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN

Centre Technique de la Forêt Communale

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REGION DU NORD

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

COMMUNE DE LAGDO



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

NORTH REGION

BENUE DIVISION

LAGDO COUNCIL

Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

**RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITES REALISEES DANS
LE CADRE DU PROJET REBOISEMENT 1400 DANS LA
COMMUNE DE LAGDO**

Période : Janvier-Décembre 2020

PLONG Claude Yannick

Le Chargé du Reboisement



**Ce projet est financé par
l'Union Européenne**

**Ce projet est mis en œuvre par
le Centre Technique de la Forêt
Communale (CTFC)**

La présente publication a été élaborée avec l'aide de l'Union Européenne. Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité de l'Association des Communes forestières du Cameroun et de son Centre Technique de la Forêt communale et ne peut aucunement être considérés comme reflétant le point de vue de l'Union Européenne

TABLE DES MATIERES

I. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION	4
II. RAPPEL DES ACTIVITES MENEES DURANT LE SEMESTRE	4
III. RESULTATS DES ACTIVITES MENEES POUR LA PERIODE (JANVIER-DECEMBRE)	6
III.1. SUIVI DES OPERATIONS DE REBOISEMENT DANS LA FORET COMMUNALE	6
III.1.2. Opérations d’entretien et de surveillance des plants	6
IV.1.3. Suivi des travaux d’installation de la pépinière de 37 000 plants à Bengui	7
IV.1.4. Délimitation et matérialisation du site retenu pour le reboisement	7
IV.1.5. Travaux de défrichage des espaces retenus (300 hectares).....	8
IV.1.6. Etat des lieux des dégats orchestrés au niveau de la pépinière de Bengui.....	9
IV.1.7. Atelier d’information et de sensibilisation des parties prenantes du projet Reboisement 1400	9
IV.1.8. Mise en place du Comité Villageois de suivi du projet au niveau de la Forêt Communale	10
IV.1.10. Opération de trouaison.....	11
IV.1.11. Opération de mise en terre des plants	12
IV.1.12. Traitement de la la plantation	12
IV.1.13. Epandage de la fumure organique	12
IV.1.14. Opération d’entretien des plants	13
IV.1.15. Construction des points d’eau artisanaux	14
IV.1.16. Opération d’arrosage.....	15
IV.2. Suivi des opérations de reboisement sur la berge Ouest du lac de Lagdo	16
IV.2.1. Suivi des opérations d’entretien et de surveillance des plants	16
IV.2.2. Suivi des opération d’arrosage des plants	16
IV.3.3. Réunion d’information et de sensibilisation des populations de Boulel et Kontip	17
IV.2.4. Délimitation et matérialisation du site retenu pour le reboisement au niveau des berges Ouest du Lac de Lagdo	18
IV.2.5. Mission d'identification des pépiniéristes privés pour l'acquisition des plants pour le reboisement des berges du lac (386 ha pour 2020).....	18
IV.2.6. Transport des plants des pépinières vers les sites à reboiser	19
IV.2.7. Opération de touaison et de mise en terre des plants.....	19

IV.2.8. Entretien des plants le long des berges (Kontip et Boulel)	20
IV.2.9. Réunion de sensibilisation des populations sur les feux de brousse et la divagation du bétail	20
IV.2.10. Opération d'arrosage des plants	21
IV.2.11. Suivi des plantation individuelle d'anacarde.....	22
V. Difficultés rencontrées.....	22
CONCLUSION.....	23
ANNEXE.....	24

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR¹, qui s'articule autour de l'APVFLEGT². Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Lagdo et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, les opérations de reboisement de 200 hectares dans la localités de Bengui et 197 hectares dans la localité de Ouro-Tchaido ce sont poursuivies conformément au différents terme de références. Le présent document présente un état des lieux des activités menées durant le premier semestre de l'année 2020.

I. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal est de reboiser les espaces dégradés de la Forêt Communale de Lagdo dans la localité de Bengui et les berges du lac de Lagdo dans 04 localités

II. RAPPEL DES ACTIVITES MENEES DURANT LE SEMESTRE

N°	Activités	Responsables	Deadline
REBOISEMENT DANS LA FORET COMMUNALE			
1.	Suivi des opérations d'entretien et de surveillance des plants	Chargé du reboisement	De Jan à Mai 2020
2.	Suivi des opération d'arrosage des plants	Chargé du reboisement	De Jan à Mai 2020
3.	Suivi les travaux d'installation de la pépinière de 37 000 plants à Bengui	Chargé du reboisement	De Mai à Juin 2020
4.	Délimitation et matérialisation du site retenu pour le reboisement	Chargé du reboisement/Communauté	08/07/2020
5.	Travaux de défrichage des espaces retenus (300 hectares)	Chargé du reboisement/Communautés	Du au 10/05/18
6.	Etat des lieux des dégats orchestrés au niceau de la pépinière de Bengui	Chargé du Reboisement/Exécutif Communal/African Commodities	05/06/2020
7.	Atelier d'information et de sensibilisation des parties prenantes du projet Reboisement 1400	Chargé du Reboisement	19/06/2020
8.	Mise en place du Comité Villageois de suivi du projet au niveau de la Forêt Communale	Chargé du reboisement/Communautés/Exécutif	23/06/2020
9.	Défrichage de 200 ha dans la FC		29/06/2020

(i) ¹ PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

(ii) ² APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

N°	Activités	Responsables	Deadline
10.	Opération de piquetage	Chargé du Reboisement/AFCOM	04/06/2020
11.	Opération de trouaison dans le site de Bengui	Chargé du Reboisement	
12.	Labelisation des sites de reboisement	Chargé du Reboisement	15/08/2020
13.	Opération de mise en terre des plants	Chargé du Reboisement/AFCOM	
14.	Traitement de la la plantation	Chargé du Reboisement/AFCOM	
15.	Epannage de la fumure organique	Chargé du Reboisement/AFCOM	
16.	Opération d'entretien des plants	Chargé du Reboisement/AFCOM	
17.	Construction des points d'eau artisanaux	Chargé du Reboisement/AFCOM	
18.	Opération d'arrosage	Chargé du Reboisement/AFCOM	
19.	Mise en place des pare-feu		
REBOISEMENT DANS LE LONG DES BERGES DU LAC			
20.	Réunion d'information et de sensibilisation des populations de Boulel et Kontip	Chargé du Reboisement	Du 02 au 04/07/2020
21.	Mission d'identification des pépiniéristes privés pour l'acquisition des plants pour le reboisement des berges du lac (386 ha pour 2020)	Chargé du Reboisement	Du 25/06 au 03/07/20
22.	Transport des plants des pépinières vers les sites à reboiser	Chargé du Reboisement	04/07 au 05/08/20
23.	Opération de trouaison	Chargé du Reboisement, CVC	03/08/2020
24.	Opération de mise en terre des plants	Chargé du Reboisement, CVC	09/08/2020
25.	Entretien des plants	Chargé du Reboisement, CVC	01/10/20
AUTRES ACTIVITES MEMEES			
26.	Formation du CVC de Boulel	Chargé du Reboisement/Transparensy	09 au 11/11/20
27.	Suivi des activités du projet ABIOGET/PADESAR3C	Chargé du Reboisement/point Focal	2019-2020
28.	Elaboration du document de projet GIZ Lagdo	Chargé du Reboisement	Mai 2020
29.	Difficultés rencontrées	Chargé du Reboisement/AFCOM	Toute la période

RECAPITULATIF DES ESPACES REBOISES DE 2019 A 2020

	Localités	surfaces	Nombre de plant	Type de plant	Période		
Projet reboisement 1400	Bengui	390 ha	20 000 plants	Anacardes	2019/2021	 <small>UNION EUROPEENNE</small>	 <small>Centre d'Organisation pour l'Environnement Rural</small>
	Ouro-Tchaido	197 ha	19 700 plants	Neems	2019/2020		
	Boulel Centre	286 ha	28 600 plants	Neems/ caccia nilotica, seaméa	2020-2021		
	Kontip	100 ha	10 000 plants	Neems/ caccia nilotica,	2020-2021		

III. RESULTATS DES ACTIVITES MENEES POUR LA PERIODE (JANVIER-DECEMBRE)

III.1. SUIVI DES OPERATIONS DE REBOISEMENT DANS LA FORET COMMUNALE

III.1.2. Opérations d'entretien et de surveillance des plants

Durant la période allant du mois de Janvier au mois de mai 2020 (06 mois), les opérations d'entretien des plants ce sont poursuivie conformément au terme de référence de l'activité. Ainsi, et malgré les difficultés liées aux conditions climatiques sévères observées au niveau de la plantation de 200 hectares de plants mis en terre, ont normalement été entretenus. Une équipe constitué de 05 gardiens a été mise sur pied. Des père-feux ont été mis en place sur une superficie de 200 hectares. A cet effet, 38 volontaires ont été retenus pour mise en place des pare-feu.



De même 05 volonaires ont été mis en place les opérations de gardiennege. Durant le (06) six mois de suivi de la plantation des difficultés ont été enregistrées dont la divagation du bétail dans les espaces reboisés malgré la vigilance des gardiens. Pour ce qui était des feux de brousse, aucun ca n'a été enregistré sur la période. Au terme de cette importante opération, l'on enregistre un taux de reuissite de 85% après l'évaluation faite par le Charge du Reboisement et les Responsable d'African Commodities.

IV.1.2. Suivi des opération d'arrosage des plants

S'agissant des opérations d'arrosage, elles ce sont déroulées dans le même sillage que les opérations de d'entretien et de protection des plants. Conformément au terme de référence, il était question d'effectuer 02 arrosage par semaine soit 48 fois pour toute la période allant de Novembre à Mai 2020. Or chemin faisant, les opérations d'arrosage ce sont heurtées à quelques difficultés. Initialement, il était prévu 02 arrosages par semaine, de fait vue le conditions climatiques sévères et la superficie totale de la plantation, nous somme passé de 02 à 06 arrosage par semaine. Cette augmentation du nombre de jour d'arrosage a entraîné une réduction de la période d'arrosage passant de 06 mois à 03 mois. Pour palier a cette

situation, une note explicative a été soumise au Centre Technique de la Foresterie Communale afin d'avoir un avenant et boucler cette opération.

IV.1.3. Suivi des travaux d'installation de la pépinière de 37 000 plants à Bengui



du partenaire, la commune de Lagdo a mis a contribution un tricycle, 02 motopompes et accessoires.




Au terme des travaux préliminaires le Chargé du Reboisement a effectué des descentes de terrain pour s'assurer du respect du cahier de charge du partenaire African Commodities conformément à la convention. Il ressort des différentes descentes que le partenaire a respecté les engagements pour ce qui est de la production des plants et l'emploi des populations pour les travaux himo.

IV.1.4. Délimitation et matérialisation du site retenu pour le reboisement

En vue du démarrage des opérations de reboisement, le Chargé du Reboisement ainsi que les conseillers municipaux de la localités concernés, le chef du village, le Djouro, leader des groupes ethniques et le partenaire African Commodities ont effectué une descente de terrain en vue de la matérialisation des 300 hectares pour le compte de l'année 2020. Cette opération résulte des recommandations issues de l'atelier d'information et de sensibilisation des parties prenantes du projet Reboisement 1400. Au terme de cette opération de matérialisation des espaces retenus pour 2020, les populations de Bengui ainsi que l'exécutif municipal ont

données un accord favorable pour le reboisement de 300 hectares pour le compte de l'année 2020. A cet effet, le Chargé du Reboisement a procédé au marquage de la parcelle avec de la peinture rouge et à la collecte des coordonnées GPS des espaces retenus. Pour finir une carte de la forêt Communale faisant ressortir les espaces dégradés a été réalisée.

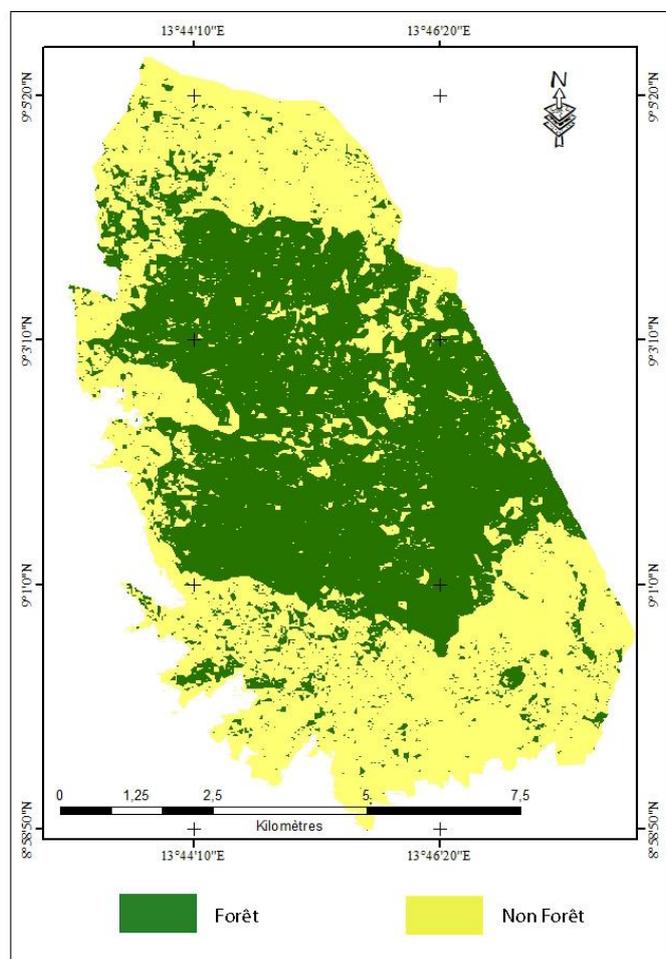

Les résultats issus du traitement des images spots 5 de la Forêt Communale de Lagdo, il ressort que l'ensemble des espaces dégradés de la Forêt font état de 2087 hectares de terre dégradées.

IV.1.5. Travaux de défrichage des espaces retenus (300 hectares)

Lancé officiellement le 25 Mai 2020, les opérations de défrichage des 300 hectares dans la Forêt Communale de Lagdo, site de Bengui ont vu la participation de plus de 45 volontaires repartis en 04 groupes. Chaque groupe était constitué de 10 à 12 personnes. Le travail de défrichage était reparti en bloc de 5 hectares pour un total de 60 blocs. Au terme de 6 jours de travail, 48 blocs soient 240 hectares ont été défrichés. Il convient de préciser que cette opération a été perturbée par un mouvement d'humeur enregistré sur le terrain et qui a été très vite maîtrisé avec le concours du sous-préfet de l'arrondissement de Lagdo et les conseillers municipaux des localités concernées.



Au terme de la première semaine du mois de Juillet 2020, les opérations de défrichage se sont bouclées après le rétablissement de l'ordre dans la localité de Bengui. Pour le suivi de cette opération, le Chargé du Reboisement a effectué 09 descentes de terrain pour s'assurer du défrichage des 300 hectares retenus pour l'année en cours et conformément aux Termes de Références.

IV.1.6. Etat des lieux des dégâts orchestrés au niveau de la pépinière de Bengui

A la suite du mouvement d'humeur, perpétré dans la localité de Bengui, des dégâts ont été enregistrés sur le terrain. Ainsi, dans le but de démarrer les activités de reboisement du projet «Reboisement 1400» pour le compte de l'année 2020, des villageois mal intentionnés ont pris d'assaut les équipes de travail lors des opérations de défrichage et de confection des piquets. De même, la pépinière mise en place d'une capacité de 37 000 plants a été vandalisée et le matériel travail a été emporté par des personnes de mauvaises fois. Aussi, nous avons enregistré trois cas de blessures graves et 05 cas de blessures légères suite aux affrontements sur le site de Bengui. Les cas les plus graves ont été transportés de toute urgence ce même jour au district de santé de Lagdo avec le concours du Maire lors de la visite de la plantation.

Cette situation a causé un arrêt des travaux pendant 12 jours dont le plus délicat a été celui des opérations d'arrosage des 37 000 jeunes plants en pépinière qui pendant 06 jours n'ont pas reçu d'arrosage. Compte tenu de toutes ces difficultés enregistrées, compte tenu du fait que le bailleur est sensible aux aspects liés aux conflits qui font partir des inévitables, le problème a été porté à l'attention du Sous-Préfet pour une sortie rapide de crise. C'est au terme de l'atelier d'information et de sensibilisation des parties prenantes que les activités ont repris après des séries d'échanges francs et fructueux.

IV.1.7. Atelier d'information et de sensibilisation des parties prenantes du projet Reboisement 1400

Etant donné que la commune de Lagdo dispose en son sein un nouvel exécutif communal issu du scrutin du 09 Février 2020, un atelier d'information et de sensibilisation des parties

prenantes du projet Reboisement 1400 a été organisé pour mettre au même niveau d'information les parties prenantes sur le projet Reboisement1400. Ont pris part a cet atelier le sous-préfet de l'arrondissement de Lagdo, les Délégué Départementaux des Forêts et de l'Environnement, le chef de poste forestier l'exécutif communal, les conseillers municipaux, les GICs et Associations et des partenaires au développement (AGIRAP, SNV, PRODEL), le Comité Diocésain de Développement des Activités Sociales et les populations des villages riverains de la Forêt Communale.

Quatre points ont été à l'ordre du jour :

- ✚ Présentation du plan d'action du projet de Lagdo
- ✚ Présentation des résultats des activités du projet R1400 pour l'année 1
 - Reboisement dans le site de la FC
 - Reboisement de la Berge Ouest du Lac
- ✚ Présentation des activités à mener pour l'année 2020
- ✚ Mise en place d'un comite villageois de gestion du projet

Au terme de cet atelier, un Comité Villageois de suivi a été mis en place dans le but de suivre localement les opérations sur le terrain et de résoudre les différents conflits qui naissent suite à la mise en œuvre du projet.



IV.1.8. Mise en place du Comité Villageois de suivi du projet au niveau de la Forêt Communale

Pour le bon déroulement des opérations sur le terrain , le Chargé du Reboisement a élaboré une convention qui lie la commune de Lagdo aux Communautés de Bengui et qui a en son sein 12 membres avec à la tête un président. (Confert annexe).

IV.1.9. Labelisation des sites de reboisement

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Lagdo, le CTFC a prévu dans son plan d'action de procéder à la labélisation des différents sites ayant l'objet de reboisement sous le financement de l'UE/ACFCAM. Ainsi pour ce qui est du cas spécifique de la commune de Lagdo deux grand site ont l'objet de labélisation. Il s'agit du site de la Forêt Communale ou un reboisement de 580 ha est prévu et le second site sur les berge Ouest du lac dans les localité de Ouro-Tchaido, Kontip et Boulel Centre.



IV.1.10. Opération de trouaison

Les opérations de trouaison dans la localité de Bengui site de la Forêt Communale se sont tenu juste après la réunion de sensibilisation et d'information des parties prenantes sur les activités à conduire dans la cadre du projet Reboisement 1400 dans la commune de Lagdo. Au total 20 000 trous ont été confectionnés soit 200 ha et près de 78 volontaires ont été engagés aujour de cette opération. Les dimensions des trous ont respecté les 40x40 cm qui avait été prévu pour cette opération. Pour s'assurer du bon déroulement des travaux sur le terrain le chargé du reboisement a effectué 12 descente de terrain pour le suivi ce cette opération.



IV.1.11. Opération de mise en terre des plants

Dans le localité de Bengui, village situé dans la FC de Lagdo les opération de mise en terre des plants ont débuté le moi de Juillet 2020 et ce sont achevées en Août 2020. Au total 2000 plants ont été prévu pour cet opération. Environ 140 volontaires ont été mobilisés pour cette opération et dont 80% de femme. Au terme de cette opération qui a duré 26 jours, 19 plants D'anacardes ont été finalement mis en terre. Les plants ont été produits par African Commodities conformément au cahier de charge. Néanmoins il convient de préciser que pour la campagne de reboisement de 2020 il était prévu de produire environ 30 000 plants. Ce qui a d'ailleurs été réalisé par le partenaires (37 000 plants d'anacardes). Suite au mouvement d'hummeur enregistré sur le site, près de 17 plants ont été détruit faisant ainsi chutter le nombre de plants a mettre en terre.

IV.1.12. Traitement de la la plantation

Après les opérations de mise en terre des plants au niveau de la Forêt Communale, s'en est suivi une vaste campagne de traitement des plants contre les attaques extérieur. Ainsi le partenaire African Commodities a mis en œuvre toutes sa technologie pour cette opération. Le matériel de traitement était constitué d'un atomiseur. Comme produit phytosanitaire nos avons administré le smartfoil et folicida. Le traitement a été administré sur les 19 000 plants mis en terre en 2020.



Au terme du traitement des plants mis en terre le partenaire a dépêché la structure ayant fourni les produit d'assurer le suivi et de vérifier le comportement des plants. Il en ressort que les plants ayant reçu le traitement ont nettement évolués et les attaques enregistrées ont été réduites.

IV.1.13. Epannage de la fumure organique

Suite au multiples difficultés enregistrées au niveau de la pépinière d'anacarde sur le site de Bengui (incursion des bêtes, suivi lâche du gardien), il a été décidé de renforcer la croissance

des plants pendant la mise en terre avec des apport en engrais bio. De ce fait le partenaire African Commodities a renforcé son opération en apportant des engrais bio afin de booster la croissance des plants. Ainsi le Chargé du reboisement a constitué une équipe de près de 15 volontaires pour l'épandage de l'engrais et dont le paiement des travaux a été pris en charge par le financement du projet reboisement 1400. La méthodologie de travail consistait à ouvrir des trous au tour de chaque plant d'une profondeur de 20 cm afin d'y introduire 15 kilogramme de fumures organiques avant de refermer le trou avec de la terre ferme. Deux balances robustes ont été mises à contribution pour peser la fumure. Et à l'aide d'une bassine nous avons procédé à l'épandage de la fumure ainsi que le montre la figure ci-après.



Le constat qui se dégage de cette opération après 1 mois d'observation est appréciable. Sur les 3820 plants ayant bénéficiés de cette technique, on note une différence significative par rapport aux autres plants n'ayant pas reçu de la fumure

IV.1.14. Opération d'entretien des plants

Ayant débuté en début de mois d'Octobre 2020 suite au départ précoce des pluies, l'entretien de la plantation d'anacarde de Bengui reposait essentiellement sur le nettoyage autour de chaque plant, la mise en place des pare-feu et le recrutement des gardiens et l'organisation des réunions de sensibilisation sur la divagation du bétail et les feux de brousse. En ce qui concerne l'entretien autour des plants, il s'agissait de nettoyer le tour du plant sur une surface 1m². pour ce qui est des pare-feu, il s'agissait de protéger la plantation contre les feux de brousse en défrichant une bande de 16 mètres sur une distance de 6 kilomètres.



Pour couvrir ses deux opérations près de 26 volontaires ont mobilisé. S'agissant des opérations de gardiennages, 07 gardiens ont été mis en place pour assurer la surveillance permanente des la plantation sur une durée de 06 mois. L'ensemble des activités su-évoquées ont été meublées par une grande campagne de sensibilisation organisé par le chargé du reboisement et qu a vu la participation d'african commodities, le chef du villages et les conseillers municipaux concernés par la zone de mise en œuvre du projet

IV.1.15. Construction des points d'eau artisanaux

En vue du démarrage des opérations d'arrosage des plants mis en terre au niveau de la Forêt Communale, il a été organisé une opération visant à identifier les zones marécageuse pour l'installation des point d'eau artisanaux pour pouvoir arroser les plants. Il était question de mettre en place cinq points d'eau reparti sur l'ensemble du site.



Au terme des travaux sur la construction des points artisanaux, nous avons pu avoir 4 points d'eau ayant une quantité importante d'eau sur les 5 initialement prévus. C'est après avoir sondé plus de 17 points d'eau que nous avons pu avoir les 04 points d'eau

IV.1.16. Opération d'arrosage

Après avoir finalisé avec la construction des points d'eau nous avons immédiatement démarré avec les opérations d'arrosage qui ont débuté le 1er Novembre 2020. Pour cette importante opération qui devrait durer près de 06 mois, un matériel constitué d'un tricycle, des bidons de 20 litres, des pompes et des tuyaux de refoulement. A cet effet, environ 150 volontaires ont été mobilisés. Le travail a consisté à procéder de façon rotative. Il s'agissait de constituer des équipes de 15 personnes par semaine pour permettre aux autres de bénéficier des avantages du projet tout en restant en conformité avec les termes de référence. Il s'agissait pour cette opération d'arroser les plants mis en terre pour la campagne de 2020. Ainsi il fallait faire des trous autour de chaque plant pour permettre une très bonne infiltration de l'eau dans le sol.



Au terme des deux premiers mois d'arrosage, les plants mis en terre ont reçu chacun trois arrosages. A cet effet le chargé du reboisement ainsi que le responsable technique d'African Commodities assure le suivi permanent de cette opération très délicate compte tenu de la rigueur du climat qui prévaut dans cette partie du pays.

IV.2. Suivi des opérations de reboisement sur la berge Ouest du lac de Lagdo

IV.2.1. Suivi des opérations d'entretien et de surveillance des plants

Au niveau des berges Ouest du lac de Lagdo, le projet Reboisement 1400 pour le compte de l'année 2019 a retenu 197 hectares de Neems dans la localité de Ouro-Tchaido. Après les opérations de mise en terre des plants, ce sont poursuivies les opérations de d'entretien et de surveillance. Dans le souci d'une réussite de cette opération, le Chargé du Reboisement s'est appuyé sur le Comité Villageois de Concertation mis en place dans le cadre du projet pilote REDD+ PNDP. Ainsi, environ 31 volontaires ont été retenus pour le défrichage et 05 volontaires pour le gardiennage sur une période de 04 mois. Il faut tout de même signaler que les difficultés enregistrées au niveau de la localité de Bengui sont les mêmes qui ont été notées dans la localité de Ouro-Tchaido. Il s'est agi des conditions climatiques extrêmes, la divagation du bétail venu des contrées environnantes malgré les efforts consentis par les gardiens. Pour ainsi faire face à la divagation du Bétail sur les espaces reboisés, le Maire de la commune de Lagdo a signé un communiqué informant des populations de mettre dans les enclos tous les bêtes ou de prévoir des bergers pour éviter que les troupeaux de bétail ne se retrouvent sur les espaces dégradés.

Dans le déroulement de cette opération, le Chargé du Reboisement a effectué 03 descentes de terrain par semaine pour s'assurer de l'effectivité des opérations sur le terrain et la présence des gardiens sur le site. Pour ce qui est de la divagation du bétail le chargé du Reboisement a pris attache avec le service d'hygiène de la commune pour traquer les bêtes en divagation sur les espaces reboisés. De même, deux (02) réunions de sensibilisations ont été organisées pour lutter contre les feux de brousse et la divagation du bétail. Par ailleurs, des pistes à bétail ont été matérialisées pour permettre aux bergers de retrouver plus facilement les différents patuâges.

IV.2.2. Suivi des opérations d'arrosage des plants

Toujours dans les opérations de reboisement des berges Ouest du Lac figurait l'arrosage des plants mis en terre. Pour ce faire 18 volontaires ont été retenus pour cette opération. Il s'est agi effectué 02 fois (02) arrosage par semaine. Durant les quatre mois prévus pour cette opération, le Chargé du Reboisement a assuré le suivi de cette opération conformément au Terme de Référence. Néanmoins des difficultés majeures ont été enregistrées sur le terrain notamment la rareté de l'eau qui obligeait les populations à parcourir près de 4 kilomètres pour l'arrosage des plants, les pannes répétées du tricycle et des motopompe qui n'ont pas

permi le bon déroulement des opérations durant le moi de Février ou le Maire se trouvait en pleine campagne pour les municipales de Février 2020.

IV.3.3. Réunion d'information et de sensibilisation des populations de Boulel et Kontip

Dans le but de demarer les opérations de reboisement au niveau des berges du lac de Lagdo, le Chargé du Reboisement a organiser un réunion d'information et de sensibilisation des populations des villages concernés sur le projet Reboisement 1400 qui est une première initiative dans leurs localité. Les 02 reunions organisées ce sont tenues respectivement à l'esplanade des écoles primaires des villages respectifs. Dans son propos préliminaire, le chargé du Reboisemet a rappeler le contexte du projet Reboisement 1400 ainsi que les objectifs du projet. Ainsi il a rappeler aux populations que dans le but de lutter contre l'ensablement du lac, la dégradation des terres et le phénomène des changements climatiques, le CTFC a retenu les localités situées le long de la berge Ouest du lac pour mettre en œuvre le projet et dont vos localités font partir. Pour l'année 2019 seule la localité de Ouro-Tchaido a été retenue et 197 hectares ont été reboisé avec un taux de réussite de 74%. Pour ce qui est de vos localités respectives le CTFC attend de vous une réussite d'au moins 90% à la fin des opérations.

A la suite des propos du Chargé du Reboisement la parole a été donnée au président du CVC pour choisir les populations qui devront accompagner le projet dans les opérations de reboisement. Ainsi 25 volontaires dont 10 femmes et 15 hommes tous issus des ethnies différentes (Mafa, Toupouri, Guiziga, Lélé, Moudan et Peul) ont été retenu uniquement pour les opérations de trouaison et de Mise en terre des plants. Pour ce qui est des opérations à venir, une autre équipe sera constituée pour permettre à chacun d'intervenir dans la mise en œuvre des activités du projet.



Photo 1: Réunion de Sensibilisation à Kontip



Photo 2: Réunion de Sensibilisation à Boulel Centre

IV.2.4. Délimitation et matérialisation du site retenu pour le reboisement au niveau des berges Ouest du Lac de Lagdo

Pour le compte de l'année 2020, les localités de Boulel Centre et de Kontip ont été retenues par le centre Technique de la Foresterie Communale pour un reboisement de 586 ha à Boulel et 100 à Kontip. Après les réunions d'information et de sensibilisation organisées dans les deux localités, le chargé de Reboisement est descendu sur le site le long de la berge avec le Comité Villageois de Concertation des localités de Kontip et de Boulel pour matérialiser les espaces retenus pour le reboisement. Il s'est agi de 286 hectares pour Boulel et 100 hectares pour Kontip.



Des jalons d'une hauteur de 2 mètres marqués de la peinture rouge ont été implantés sur le site à reboiser et des références géospatiales ont été collectées et consignées dans une base de données.

IV.2.5. Mission d'identification des pépiniéristes privés pour l'acquisition des plants pour le reboisement des berges du lac (386 ha pour 2020)

En vue des opérations de reboisement en cours dans la commune de Lagdo, le chargé de Reboisement a effectué des descentes au niveau des pépinières privées pour avoir la situation des plants de chaque pépiniériste pour le reboisement des berges du lac. Il s'est agi de s'assurer de la disponibilité d'environ 30 000 plants forestiers. Le reste des 8 600 plants devront être fournis par la commune représentant sa contribution dans la mise en œuvre du projet. Au terme de la visite des pépiniéristes privés dans la commune de Lagdo et celle de Ngong des plants de qualité ainsi que les quantités ont été collectés et consignés dans le tableau ci-dessous :

NOMS ET PRENOMS DU PEPINIERISTE	LOCALITES/QUARTIERS	TYPES DE PLANTS	QUANTITES	PRIX UNITAIRE
ISALNE David	Gounougou	Neem	4 500	100
Mme NanPoum Françoise	Lagdo Centre	Neem	2 000	100
GODE Lawani	Ouro-Kessoum	Neem	3 200	100

Wassa	Lagdo Centre	Neem	3 500	100
TAIRA	Ngong	Neem	1000	100
RIH Nguéri	Ouro-Tchaido	Neem	4 000	100
Hamana Silas	Lagdo Centre	Neem	3 800	100
BOUBA Vondou	Lagdo Centre	Neem	11 350	100
WARI Bienvenu	Mafakilda	Neem, Accacia Nilotica	5 300	100
YAOUBA	Lagdo Centre	Accacia Nilotica	1000	100
TOTAL			39 650	

IV.2.6. Transport des plants des pépinières vers les sites à reboiser

Durant le mois de juillet, le chargé de reboisement, après avoir effectué des descente auprès de pépiniéristes privés et après avoir validé les plants de qualité pouvant faire l'objet d'un reboisement a assurer le transport des plants des pépinières privés vers les espaces à reboiser. Ainsi il était question de transporter 28 600 plants vers le site de Boulel Centre et 10 000 plants pour le site de Kontip. Comme moyen de transport, la commune a mis à contribution le tricycle. Pour les points les plus éloignés (Mafakilda, Ngong et Garoua 3) nous avons procédé à la location des pick-up et d'un camion.



IV.2.7. Opération de touaison et de mise en terre des plants

Après l'opération d'identification des pépiniéristes privés en vue de l'acquisition des plants forestiers, le chargé du reboisement a lancé de façon simultanée les opérations de trouaison et de mise en terre des plants sur les sites de Boulel et de Kontip. Au total, 38 600 trous ont été confectionnés dont 10 000 trous à Kontip et 28 600 trous à Boulel Centre. Cette

opération s'est appuyée sur les Comités Villageois de Concertations mis en place dans le cadre du projet pilote REDD+ PNDP. Environ 43 volontaires se sont investis pour ce travail avec près de 40% de femmes. Cette opération a été bouclée le 26 Août 2020. Le suivi des opérations sur le terrain était effectué par le chargé du reboisement et assisté dans cette tâche par les présidents des comités villageois de concertations

IV.2.8. Entretien des plants le long des berges (Kontip et Boulel)

Les opérations d'entretien des plants mis en terre ont effectivement débuté pendant le mois d'Octobre 2020. Il s'est agi au cours de cette opération de mettre en place des pare-feu, du nettoyage des tours de plants et la mise en place des gardiens. L'objectif visé par cette opération était de faire face aux feux de brousse récurrents enregistrés dans la zone ainsi que la divagation du bétail sur les sites reboisés. De ce fait 05 gardiens ont été mis en place dont 03 effectuent la patrouille en journée et les 02 autres dans la nuit. Cette situation résulte du fait que nous avons constaté que dans la nuit les éleveurs pour la plupart le Bororo font paître leurs troupeaux dans la nuit. Les pare-feu qui ont été mis en place couvrent une distance de 3 Kilomètres sur le site de Kontip et 05 Kiloimètres pour le site de Boulel Centre. Durant les 02 premiers mois de l'entretien sur les 06 mois prévus le chargé du reboisement a effectué 27 descentes sur le terrain. Il était question au cours des missions effectuées sur le terrain de vérifier si les gardiens retenus sont en poste et de vérifier si les pare-feu mis en place respectent les dimensions préconisées.

IV.2.9. Réunion de sensibilisation des populations sur les feux de brousse et la divagation du bétail

En date du 09 Novembre 2020 le chargé du reboisement ainsi que le chef de poste forestier de Lagdo ont organisé deux réunions de sensibilisation dans les villages Kontip et Boulel Centre. Étaient présents à ses deux importantes assises les chefs de villages, les chasseurs, les présidents des CVC, les éleveurs Bororo et les populations des villages concernés. Il était question au cours de ses deux assises de présenter le projet reboisement 1400 ainsi que les espaces qui ont fait l'objet d'un reboisement. Dans sa prise de parole, le chef de poste forestier est revenu sur l'importance des arbres tel que présenté par le MINFOF. Il a exhorté les populations desdits villages à accorder une attention particulière aux plants qui ont été mis en terre afin de faire face au réchauffement climatique déjà perceptible dans la zone. À la suite du chef de poste forestier le chargé du reboisement a demandé aux chasseurs d'éviter les espaces reboisés pour leur activité de chasse par l'usage des feux de brousse il en est de même pour les éleveurs qui utilisent les feux de brousse pour rajeunir les pâturages. Il a demandé aux populations ayant des vaches de respecter les couloirs qui ont été matérialisés pour permettre aux bétails d'aller s'abreuver sans empiéter sur les espaces reboisés. Pour conclure, les chefs des deux villages ont rappelé aux propriétaires des différents animaux qui seront en divagation

sur les espaces reboisé par le projet reboisement 1400 seront tranfés au niveau de la fourrière municipale.

IV.2.10. Opération d'arrosage des plants

Ayant debuté en début Novembre 2020, les opération d'arrosage le long des berges s'étand sur une période 04 mois allant du mois de novembre au mois Mars 2020. Conformément au TDR il était prévu d'effectuer 02 arrosages par semaine. Au stade actuel, les plants mis en terre ont déjà reçu deux arrosage. Pour ce travail la commune a mis à contribution un tricycle 02 motopompes ainsi qu'un personnel pour conduire le tricycle. A la différence du site de la Forêt communale, l'eau pour l'arrosage est dirrectement capter dans le lac de Lagdo



Pour cette opération, un total de 10 volontaires effectuent les travaux sur le terrain et contitué d'au moins 03 à 04 femmes par site. Les opérations débute très tôt le matin (07h30) pour s'achever à (11h30) à raison de l'augmentation de la température à partir de 12h ce qui ne facilite pas le travail et peux dans une certaine mesure endommager les plants

IV.2.11. Suivi des plantation individuelle d'anacarde

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet reboisement 1400 dans la commune de Lagdo, le projet a appuyer les populations volontaire dans la vulgarisation de cette nouvelle culture considéré de nos comme un nouvelle culture de rentre pouvant remplacer le coton. De fait, le projet reboisement 1400, la commune de Lagdo et le patenaires African Commodities ont appuyés environ 576 volontaires. C'est le cas d'un producteur localisé dans la localité de Ouro-Doukoudjé qui a pu mettre en place une plantation de 10 hectares d'anacarde.



Le suivi cette plantation se fait 02 fois tous les mois par le chargé du reboisement ainsi que l'équipe technique d'African Commodities. Dans ce suivi nous apportons des conseils en ce qui concerne les traitement phytosanitaire, et les opération d'arrosage. Il en ait de même pour les entretiens.

V. Difficultés rencontrées

Plusieurs difficultés ont été enregistré aucours de la mise en œuvre des activités du projet Reboisement 1400 dans la communes de Lagdo. On peut citer entre autre :

- ✚ Destruction de près de 17 000 plants d'anacardes par les petits ruminants à la pépinière de Bengui ;
- ✚ Vol du matériel de reboisement (pioche, pelle, machette, bidon) ;
- ✚ Divagation du bétail sur les espaces reboisés ;
- ✚ Moyen de transport des plants et de l'eau pour la mise en terre et les opération d'arrosage très limité ;

- ✚ Utilisation des herbicides par les agriculteurs pour traiter des champs qui fragilisent les jeunes plants d'anacarde dans la FC et les forestiers le long de la berge du lac.

CONCLUSION

Parvenus au terme des activités menées durant l'année 2020, l'ensemble des activités du projet Reboisement 1400 prévu pour l'année 2019-2020 n'ont pas été bouclé entièrement. Pour ce qui est des opérations de reboisement dans la Forêt Communale de Lagdo, site de Bengui, l'on enregistre un reboisement de 190 hectares. Du côté de la berge Ouest du Lac ou 286 hectares ont été reboisés dans la localité de Boulel Centre et 100 hectares dans la localité de Kontip, on enregistre un taux de réussite de 90%.

Pour les opérations de 2020, le partenaire African Commodities a mis en place une pépinière de 37 000 plants d'anacarde pour un reboisement de 300 hectares. Aussi, un atelier d'information et de sensibilisation des parties prenantes a été organisé pour mettre au même niveau d'information toutes les parties prenantes. Pour ce qui est des opérations de reboisement, les opérations de défrichage ont été bouclées ainsi que la confection des piquets malgré le mouvement d'humeur enregistré au niveau de la plantation qui a d'ailleurs été résolu avec le concours du Sous-Préfet de l'arrondissement de Lagdo, l'exécutif municipal et le Chargé du Reboisement. Au stade actuel les opérations de surveillance et d'arrosage se poursuivent jusqu'au mois de Mai 2021. Néanmoins, il convient de préciser que des difficultés ont été enregistrées dans la mise en œuvre du projet.

ANNEXE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

REGION DU NORD

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

COMMUNE DE LAGDO



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

NORTH REGION

BENUE DIVISION

LAGDO COUNCIL

N° ____L/CLDO/R1400/2020

Lagdo le ; _____

Le Maire de la commune de Lagdo
A
Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement
de Lagdo

OBJET : Etat de la situation conflictuelle dans la localité de Bengui
Dans le cadre du Projet «**Reboisement 1400**»

Monsieur le Sous-Préfet

Je viens par la présente correspondante vous faire le point de la situation conflictuelle enregistré en date du 28 Mai 2020 dans la localité de Bengui site de la forêt communale de Lagdo.

De prime à bord, l'Association des Communes Forestières du Cameroun a bénéficié d'une subvention de l'Union européenne pour appuyer une dizaine de communes septentrionales du Cameroun en matière de reboisement. Afin d'accompagner la stratégie nationale que vient d'adopter le gouvernement pour promouvoir les anacardes, le commune de Lagdo a été retenue afin de vulgariser ce produit dans la zone à travers le projet « **Reboisement 1400** »

La délicatesse de la culture d'anacarde et les contraintes du marché international nécessitent un partenaire privé de référence pour accompagner la commune de manière professionnelle. Pour cela une entreprise AFRICAN COMMODITIES de droit Suisse et Camerounais présente dans le Septentrion a été identifiée et un protocole de partenariat public privé avec la Commune mis en place.

Ainsi, dans le but de démarrer les activités de reboisement du projet «**Reboisement 1400**» pour le compte de l'année 2020, des villageois mal intentionnés ont pris d'assaut les équipes de travail lors des opérations de défrichage et de confection des piquets. De même, la pépinière mise en place d'une capacité de 37 000 plants a été vandalisée et le matériel travail a été emporté par des personnes de mauvaises fois. Aussi, nous avons enregistré trois cas de blessures graves et 05 cas de blessures légères suite aux affrontement sur le site de Bengui. Les cas les plus graves ont été transportés de toute urgence ce même jour au district de santé de Lagdo avec le concours du Maire lors de la visite de la plantation.

Eu égard à cela, les travaux sur le terrain sont à l'arrêt dont le plus délicat est celui des opérations d'arrosage des 37 000 jeunes plants en pépinière qui depuis 06 jours n'ont pas reçu d'arrosage. Compte tenu de toutes ces difficultés enregistrées, compte tenu du fait que le bailleur est sensible aux aspects liés aux conflits qui font partir des inévitables, nous souhaitons que des mesures soient prises pour une sortie de crise et que les opérations continuent dans le calme et la sérénité.

Comptant sur votre encadrement, je vous prie de recevoir Monsieur le Sous-Préfet mes très distinguées salutations.

Ampliations
Préfet/Bénoué ;
ACFCAM ;
CTFC ;
Chrono/archive.

Le Maire

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

REGION DU NORD

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

COMMUNE DE LAGDO



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

NORTH REGION

BENUE DIVISION

LAGDO COUNCIL

**CONVENTION N° ____/C/LDO/R 1400/2020 PORTANT SUIVI DES OPERATIONS DE
REBOISEMENT DU PROJET REBOISEMENT 1400 DANS LA COMMUNALE DE LAGDO
(BENGUI)**

ENTRE

LA COMMUNAUTE DE BENGUI

ET

LA COMMUNE DE LAGDO DANS LE CADRE DU PROJET REBOISEMENT 1 400

Junin 2020

PREAMBULE

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR³, qui s'articule autour de l'APVFLEGT⁴. Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet « REBOISEMENT 1400 », la commune de Lagdo à bénéficier d'un financement de l'Union Européenne. L'action, sous forme d'une subvention octroyée à l'Association des communes forestières du Cameroun (ACFCAM), permettra de conduire des activités de reboisement et de régénération dans les forêts communales des zones sèches et de transition en général et dans la Forêt Communale de Lagdo en particulier.

Pour ces travaux, nous communauté de Bengui avons désigné 40 personnes pour la main d'œuvre constituées des hommes et des femmes.

A cet effet, il est convenu entre la Commune de Lagdo ci-après désignée "la Commune" Représentée par Monsieur **KAGA Luc**, BP 02 Lagdo ; **Tél : (0237) 237 690 357 519/697 362 212**, Maire de la commune de Lagdo ; agissant en qualité de Maître d'ouvrage délégué dans le cadre du projet Reboisement 1400.

D'une part,

Et d'autre part,

La communauté du village Bengui Représentée par Monsieur **YOUSSOUFA Hagalgaba CNI N° 116311820** **Tél : 691 62 38 29**, Représentant de ladite communauté ; la convention de mise en œuvre des travaux de reboisement dans le site de Bengui ci-après désigné la « convention de travail » dont la teneur suit :

TITRE I : OBJET, OBLIGATION ET RESPONSABILITES DES PARTIES

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention de travail a pour objet le suivi communautaire des activités du projet de reboisement du site de Bengui dans le cadre du projet « Reboisement 1400 dans la Forêt Communale de Lagdo.

Article 2 : Durée de la convention

La présente convention prend effet dès sa signature sur une période de 4 ans.

Article 3 : Création du Comité Villageois de Suivi dans le cadre du projet Reboisement 1400

Il est créé à cet effet au sein de cette communauté un Comité Villageois de Suivi composé de :

- ✚ Président : YOUSSOUFA Kalgaba
- ✚ Vice-Président : TOUMBA Mapkousse
- ✚ BASSOU Sammuel (Secrétaire)
- ✚ FADIMATOU Mana (Trésorier)
- ✚ FALAMA (Commissaire au Compte)
- ✚ MOUSSA Hamadjoda (Conseiller)
- ✚ FALAMA (Commissaire au Compte)
- ✚ ABAKALAO Moïse (Membre)
- ✚ DJEBA Aboukar (Membre)
- ✚ SOUKI (Membre)
- ✚ ILA Youssoufa (Membre)
- ✚ HAROUNA Girda Assira (Membre)
- ✚ HAOUA Mahamat (Membre)

Article 4 : Obligation des parties

Alinéa 1 : Obligations du Comité Villageois de Suivi de Bengui :

(iii) ³ PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier
(iv) ⁴ APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

Le Comité Villageois de Suivi a pour obligations de :

- ✚ Désigner les volontaires pour les opérations de reboisement ;
- ✚ Veillez à la sécurisation du matériel du projet ;
- ✚ Assurer la protection des plants mis en terre ;
- ✚ Gérer les éventuels conflits liés à la mise en œuvre des activités du projet.

Alinéa 2 : Obligations de la commune de Lagdo

La Commune de Lagdo, a pour obligations de :

- S'assurer de la mise en œuvre effective des activités selon les règles de l'art ;
- Assurer le Suivi technique des activités sur le terrain ;
- Tenir des réunions mensuelles avec le Comité Villageois de Suivi
- Organiser des réunions trimestrielles avec le Comité Villageois de Suivi.

TITRE II : RESULTATS ATTENDUS

- ✓ Les opérations de reboisement du site de Bengui sont effectivement réalisées ;
- ✓ Les dépenses sont effectivement exécutées pour les activités prévues ;
- ✓ Les pièces comptables sont collectées, classées et archivées.

TITRE III : LE FINANCEMENT DES ACTIVITES

Article 5 : Paiement

Alinéa 1 : Mode de paiement

Les paiements sont effectués après chaque opération avec une décharge sous présentation de la photocopie de la carte d'identité nationale et sur la base du cumul de leurs superficies piquetées, de nombre de trous, de nombre des plants mis en terre, et des superficies arrosées et surveillés en faisant des fiches des décharges avec leur carte d'identité nationale.

Article 6 : validation technique des opérations de reboisement

La validation est effectuée par une équipe composé de :

- ✚ Le Chargé du Reboisement 1400 ;
- ✚ Le président du Comité Villageois de Suivi ;
- ✚ Le responsable d'African Commodities

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 7 : Tout désaccord survenant entre les parties dans l'application de la présente convention de travail est résolu à l'amiable. En cas de persistance, le désaccord est soumis à l'arbitrage des hiérarchies respectives.

La présente convention est établie en français et produit en cinq exemplaires originaux dont un remis à la Commune, un au chargé du reboisement, un exemplaire au représentant de la communauté, un au chef d'antenne de l'ACFCAM et au Centre Technique de la Forêt Communale (CTFC).

La présente convention entre en vigueur après sa signature par les différentes parties prenantes.

Fait à Lagdo, le _____

Le Maire

Le Président du Comité de Bengui



**ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES
DU CAMEROUN (ACFCAM)**

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél.:(00237) 22 20 35 12 Email:ctfccameroun@yahoo.com

Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

**COTISATION DE LA COMMUNE DE LAGDO AUPRES
ACFCAM**

Conformément à la délibération de l'Assemblée générale l'Association des Communes Forestières du Cameroun (ACFCAM) du 23 Janvier 2017 autorisant le Directeur Général du FEICOM à retenir à la source sur les ISP des Communes membres, le montant annuel des cotisations dues et à le reverser sur le compte bancaire de l'ACFCAM pour le compte des années 2020.

Le Maire de la Commune de LAGDO autorise le Directeur général du FEICOM à effectuer le prélèvement suivant à la source sur les ISP :

**Prélèvement pour Cotisation auprès de l'ACFCAM pour
le compte de l'année 2020**

MONTANT

1000 000 FCFA

Un Million FCFA

SIGNATURE ET CACHET

Raga Luc



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN

Centre Technique de la Forêt Communale

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com

Site web : www.foretcommunale-cameroun.org

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REGION DU NORD

DEPARTEMENT DE LA BENOUE

COMMUNE DE LAGDO



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

NORTH REGION

BENUE DIVISION

LAGDO COUNCIL

RAPPORT D'EXECUTION FINANCIERE

PERIODE DE MAI A AOUT 2020

Tableau 1: Relevé détaillé des dépenses pour la période considérée [MAI 2020] à [AOUT 2020]

Activités	Sous-Activités	Input	Dépenses prévues (FCFA)	Dépenses réelles	Contribution de la commune	Reliquats	Observations
Composante 2: Reboiser 300 hectares de la FC							
Opération de défrichage et de piquetage des 300 ha de la Forêt Commulæe de Lagdo	Défrichage des espaces retenus	Défrichage	1 500 000	1 500 000	0	0	
	Rechercher les jalons et confection des piquets	Confection des Piquets	750 000	750 000	0	0	
		Transport des piquets	20 000	20 000		0	
	Effectuer le piquetage des espaces retenus	Piquetage	1 500 000	1 500 000	0	0	
	Carburant pour transport des piquets vers le site	Tours/tricycle	30 000	30 000	0	0	
	Matériels	Achat pot de peinture(1kg)	3 000	3 000	0	0	
		Diluant	2 000	2 000	0	0	
Pinceaux		500	500	0	0		
Suivi des activités	Carburant Chargé du Reboisement		0	0	75 600	0	
	Vidange moto AG 100		0	0	7 800	0	
	Sous Total 1		3 840 000	3 840 000	83 400	0	
TOTAL : 3 923 400F CFA							
Atelier de sensibilisation et communication auprès des parties prenantes du projet	Forfait transport sous-préfet	H/J	50 000	50 000	0	0	
	Forfait transport Maire de Lagdo	H/J	30 000	30 000	0	0	
	Forfait transport chef de poste forestier de Lagdo	H/J	10 000	10 000	0	0	
	Forfait transport DDMINFOF	H/J	30 000	30 000	0	0	
	Forfait transport DDMINEPDED	H/J	30 000	30 000	0	0	
	Forfait transport Délégué d'Agriculture de Lagdo	H/J	10 000	10 000	0	0	
	Forfait transport Exécutif Communal + Conseillers	H/J	150 000	150 000	0	0	
	Forfait transport Chefs de villages (05)	H/J	50 000	50 000	0	0	
	Forfait transport Représentant OSC	H/J	10 000	10 000	0	0	
	Forfait transport Représentant des exploitants de bois	H/J	10 000	10 000	0	0	
	Forfait transport représentant des GICs	H/J	10 000	10 000	0	0	
	Reseau des femmes de Lagdo (ROFAL)	H/J	10 000	10 000	0	0	
	Perdiem Chargé du reboisement	H/J	10 000	10 000	0	0	
	Animateur AGIRAP/PNDP de Lagdo	H/J	10 000	10 000	0	0	
	Perdiem Représentant African Commodities	H/J	10 000	10 000	0	0	
Frais de transport des populations des villages de la zone du projet (20)	H/J	100 000	100 000	0	0		
Pause café	U		84 000	84 000	0	0	

	Pause déjeuner	U	112 000	112 000	0	0	
	Rafraichissant	Palette	30 000	30 000	0	0	
	Matériels	Kit des participants	56 000	56 000	0	0	
		Banderolles	25 000	25 000	0	0	
		Location de la salle	0	0	50 000	0	
		Location vidéo projecteur	0	0	20 000	0	
		Impression et Reprographie des documents	0	0	100 000	0	
	Sous Total 2		837 000	837 000	270 000	0	
TOTAL : 1 107 000							
Opération de trouaison dans la FC de Lagdo	Confection des Trous	Trous	3 000 000	2 000 000		1 000 000	
	Suivi des activités sur le terrain	Litre		0	94 500	0	
		Litre			0	26 000	0
	Sous Total 3		3 000 000	2 000 000	120 500	1 000 000	
TOTAL : 3 120 500 Dépense réelle= 2 000 000 Reliquat= 1 000 000							
Opération de mise en terre des plants dans la FC de Lagdo	Mise en terre des plants	Carburant pour transport des plants vers les espaces à, reboisés	283 500	192 000	0	91 500	
		Manutention des plants (Chargement/Déchargement	900 000	586 700	0	313 300	
		Location tricycle	0	0	500 000	0	
		Mise en terre	1 500 000	1 000 000	0	500 000	
	Matériels	Achat des engrais	500 000	500 000		0	
	Réalisation d'un documentaire sur les activités réalisées pour la deuxième année	H/J	60 000	60 000	30 000	0	
	Suivi des activités sur le terrain	Litre	0	0	126 000	0	
		Litre	0	0	31 200	0	
	Sous Total 4		3 243 500	2 338 700	687 200	904 700	
TOTAL : 3 930 700 Dépense réelle= 2 338 700 Reliquat= 904 700							
Composante 2: Reboiser 386 hectares le long des berges Ouest du lac de Lagdo (Kontip et Boulel Centre)							

Reboisement de la berge ouest du lac de Lagdo dans la localité de Kontip	Confection des trous	10 000 trous	500 000	500 000	0	0	
	Acquisition des plants forestier	10 000 plants	1 000 000	1 000 000	0	0	
	Mise en terre des plants	Carburant pour transporter les plants vers les espaces à reboiser		90 000	90 000	0	0
		Manutention des plants		300 000	300 000	0	0
		Plant mis en terre		500 000	500 000	0	0
		Location tricycle pour transport des plants		0	0	160 000	0
	Surveillance et entretien des plants	Motivation des gardiens (05)		300 000	300 000	0	0
Suivi des activités	Carburant Chargé du reboisement	litre	0	0	47 250	0	
	vidange moto AG100	Litre	0	0	13 000	0	
	Sous Total 5		4 231 000	4 231 000	220 250	0	
TOTAL : 7 464 000 F CFA							
Reboisement de la berge ouest du lac de Lagdo dans la localité de Boulel Centre	Confection des trous	28 600 trous	1 430 000	1 430 000			
	Acquisition des plants	28 600 plants	2 000 000	2 000 000	860 000		
	Mis en terre des plants	Carburant pour transporter les plants vers les espaces à reboiser		280 000	280 000	0	
		Manutention des plants (Chargement/Déchargement)		845 000	845 000	0	
		Plant mis en terre		1 430 000	1 430 000	0	
	Suivi des opérations sur le terrain	Carburant Chargé du reboisement		0	0	53 550	
		Vidange MotoAG 100		0	0	13 000	
	Sous Total 6		5 985 000	5 985 000	926 550		
TOTAL : 6 911 550 F CFA							
Replanter d'autres arbres en ligne de bordure autour de la plantation d'Anacarde de Bengui	Acquisition des plants forestiers	8 000 plants	800 000	800 000	0	0	
	Trouaison	8 000 trous	400 000	400 000	0	0	
	Mise en terre	8 000 mis en terre	400 000	400 000	0	0	
	Carburant pour transport des plants	Litre	140 000	140 000	0	0	
	Manutention des plants (Chargement Déchargement)	Plant	164 700	164 700	0	0	
	Suivi des opérations sur le terrain	Carburant et Vidange MotoAG 100			125 400	0	
	Sous Total 6		1 904 700	1 904 700	125 400	0	

TOTAL : 2 030 100 FCFA

TOTAL GLOBAL DECAISSE: ACFCAM : 21 136 400 F CFA ; DEPENSES REELLES : 19 231 800 CONTRIBUTION COMMUNE : 2 433 300 F CFA
